



Überwachen von Aufträgen

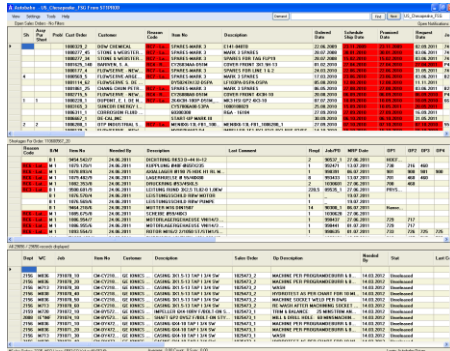


Discussion Tracking

Führe die Diskussion
Einmal an einem Platz.

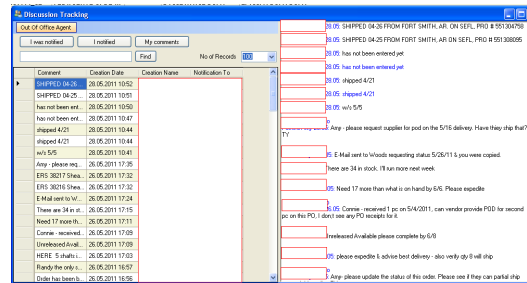

Indicator Tracking

Tägliche Aufnahmen von Statuskennzahlen zur Trendermittlung.

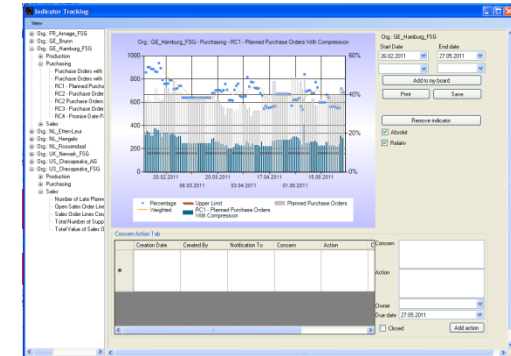


Integrated Workflow

Cockpit



Strukturierter Ansatz zum Aufruf der Filter.

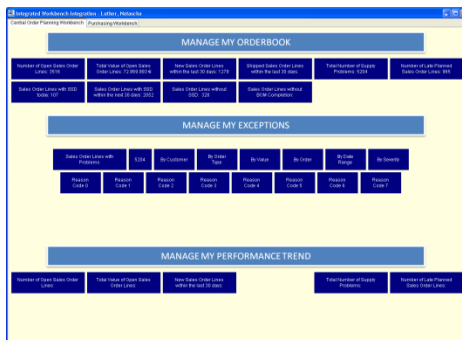


INGravure
digital engineering

Autobahn

Überwachen von Kundenaufträgen, Einkaufs- und Fertigungsaufträgen über die gesamte Fabrik und entlang der Abhängigkeiten.

Kernpunkte:

- Kundenauftragsauflösung zur Fertigung und zurück
- Schlanke Entwicklungs- und Veröffentlichung– Click Once
- Kommentare und Übertragung der Verantwortung an den Aufträgen
- Erweiterte Filtertechnologie – filter einmal und spare Deine Zeit für immer
- Standardisierte Problembeschreibung bei den Fehlteilen
- Ansicht unterschiedlicher Fabriken zur gemeinsamen Planung
- Ein Linksklick auf die Felder ruft die Daten auf
- Kontext spezifische Rechtsklickmenüs
- Eine Maske gibt alle Informationen über das gesamte ERP System
- Ein Suchfeld findet alle offenen Aufträge und Informationen



2	CHP Standard	SPARES-MARK 3	E141-040TB	23.12
5	CHP Standard	SOFTWARE	DOCUMENTATION REQ'D BY	18.12
1	CHP Drop Ship	DRIVER	UJ25S1AM	15.12
5	CHP Standard	SOFTWARE	DOCUMENTATION REQ'D BY	20.01
45	CHP Standard	SPARES-MARK 3	MARK 3 SPARES	30.01
46	CHP Standard	SPARES-MARK 3	MARK 3 SPARES	30.01
34	CHP Standard	Filter	ES FOR TAG FLP19	15.02
9	CHP Standard	Export To XML	F-UP SERVICE	01.03
10	CHP Standard	Reload Grid	SPECIAL	23.03
170	CHP Standard	Copy Call Or Rows To Clipboard	SPECIAL	29.03
1	CHP Standard	NAFTA check	IDE PROCESSING	31.03
10	CHP Standard	SEAL OIL GP3 1B & 08	OIL GP3 1B & 08	27.04
20	CHP Standard	BY90424F-TSSR	SEAL OIL GP3 1B & 08	27.04
30	CHP Standard	CY32768BA-ZH	SHAFT GP2 FOR SLV WELDED	27.04
40	CHP Standard	DY55723A-CI	HOUSING BRNG GP3 MK3A	27.04
50	CHP Standard	DY55723A-CI	HOUSING BRNG GP3 MK3A	27.04
60	CHP Standard	DY27463ACP-DC12	ADAPTER BRG HSG GP3 16 MK3A	27.04
70	CHP Standard	95086708	O-RING -249 NBR	27.04

Erste Verwendung

Aktive Felder

Aufträge auflösen

Fehlteile und RC

PO WIP rückverfolgen

Filter erstellen

Filter speichern

Filter verwalten

Standardfilter

Filter entwickeln

Filterverwendung

Kommentare einfügen

Benachrichtigen

Verantwortlichkeit

Suche

Spalten sortieren

Kalkulationen

Feldbeschreibungen

Kundenaufträge

Fehlteilliste

Fertigungsaufträge

Einkaufsaufträge

Fertigungs Details

Organisation wechseln

Installation

Updates

Rechtsklick Menüs

Kundenaufträge

Fehlteile

Einkaufsaufträge

Fertigungsaufträge





A Autobahn - GE_Hamburg_FSG From EDC PROD 19.09.2011 19:46:59												
View Settings Tools Help				Demand		Find		Next		GE_Hamburg_FSG		
Open Sales Orders - No Filters				Open Notifications:								
Sh	Assy Pur Short	Probi	Cust Order	Customer	Reason Code	Job/PO	Item No	Description	Ordered Date	Schedule Ship Date	Promi Date	
▶			110600397_11	KEPPEL FELS - SINGAPORE - 62			1HT-110600397-3	FIELD SERVICES ASSISTANCE DURING START...	28.03.2008		31.12	
			110600397_12	KEPPEL FELS - SINGAPORE - 62			1HT-110600397-4	TECHNICAL SUPPORT / ASSISTANCE ON SITE	28.03.2008		31.12	
			110600397_13	KEPPEL FELS - SINGAPORE - 62			1HT-110600397-5	START-UP, TEST RUN, TRAILS	28.03.2008		31.12	
			110600397_15	KEPPEL FELS - SINGAPORE - 62			1HT-110600397-7	MONTAGE- AND SUPPORT TOOLS	28.03.2008		31.12	
			130108298_1	FLOWSERVE HAMBURG GmbH			1HVE000169	MONTAGE PUMPEN FUER TYPPRUEFUNG XEM...	22.09.2010		30.06	
			130200007_1	FLOWSERVE TANEYTOWN			1HT-130103752	VNI12-120-4-74/-480-3PH.60	29.09.2006		29.09	
			130200007_2	FLOWSERVE TANEYTOWN			1H-FV	FRACHT UND VERPACKUNG	29.09.2006		29.09	
			160100033_1	PLE TECHNIK			1HR-160100033	Motor M6-400-2	13.02.2003			
			160100033_2	PLE TECHNIK			1HFRACHT	FRACHT	13.02.2003			
			160100033_3	PLE TECHNIK			1H-FV	FRACHT UND VERPACKUNG	13.02.2003			
			160100169_1	MARCO PORSCH			1HR-160100169	PN84-7A + M8-64-2	30.06.2003			
			160100169_2	MARCO PORSCH			1H-FV	FRACHT UND VERPACKUNG	30.06.2003			
			160100373_1	SUDERBURG			1HR-160100373	P102-4 + V11-70	03.02.2004			
			160100373_2	SUDERBURG			1H-FV	FRACHT UND VERPACKUNG	03.02.2004			
			160100434_1	RKW AG Rheinische Kunststoffwerk			1HR-160100434	Manhlock Pumpe Ton 50-32-2000	19.04.2004			
Shortages For Order: 210600059_1												
Reason Code	B/M	Item No	Needed By	Description	Last Comment	Buyer	Planner	Reqd	Job/PO	MRP Date	Ol	
RC3 - Late Pr...	B 1	9452.627/5	27.09.2011	SCHRAUBE M8x25 DIN EN ISO 4762	Trigger	PERBANDT, Mr. Jörn	MIN-MAX	9	93681_14	28.09.2011	F	
	B 1	9500.092/5	27.09.2011	LEITUNG RUND 3x95/50 TL06-1 1,0KV		HEKTER, Mr. Kurt	HEKTER	180	92474_1	08.12.2011	PF	
	M 1	1082.743/5	27.09.2011	LAGERHUELSE Ø 70/55x50		MABILEAU, Mr. Fra...	MABILEAU	9	1041674	21.11.2011	62	
	M 1	1082.744/4	27.09.2011	SANDGLOCKE Ø103,23/55x105,5		MABILEAU, Mr. Fra...	MABILEAU	3	1041675	21.11.2011	62	
	M 1	1082.746/2	27.09.2011	HUELSE Ø55/69x46		MABILEAU, Mr. Fra...	MABILEAU	6	1041967	21.11.2011	62	
	M 1	1082.748/0	27.09.2011	KAPPE Q12		MABILEAU, Mr. Fra...	MABILEAU	3	1041968	21.11.2011	62	
	B 1	BJ631198JZ	27.09.2011	PIN,DOWEL 500K.625		JESSE, Mrs. Mareen	MIN-MAX	6	-	28.09.2011		
	B 1	BJ1002461	27.09.2011	MUT.Hex.MSCR 10-24UNC		JESSE, Mrs. Mareen	MIN-MAX	6	-	28.09.2011		
	B 1	9464.252/8	27.09.2011	SCHIEBE AG 4 DIN125		VÖLKER, Mrs. Evelyn	VÖLKER	6	93758_1	21.11.2011	He	
▶	M 1	BJ313968Y	27.09.2011	BEARING,SOLID SHOE 6.000		MABILEAU, Mr. Fra...	MABILEAU	3	1041999	28.09.2011	58	
RC6 - Late St...	M 1	BJ631306KD	27.09.2011	BEARING,PIVOT 8.000 ASSY		MABILEAU, Mr. Fra...	MABILEAU	18	1054235	28.09.2011	72	
	M 1	BJ211315JK	27.09.2011	RING,HOUSING 4.312		MABILEAU, Mr. Fra...	MABILEAU	3	1041998	28.09.2011	70	
RC6 - Late St...	M 1	1HBJ000352	27.09.2011	HOUSING,BRG,RDL LOWER 12M GEOTH...		MABILEAU, Mr. Fra...	MABILEAU	3	1041973	28.09.2011	70	
Open Purchase Order Lines - No Filters												
Vendor	PO_Line	Buyer	Item No	Item Description	Qty Ordered	Qty Received	Sales Order	Printed Date	Promise Date	Las		
▶	1411_1	GIERZ, Mr. Robert	1HAUSWAERTS	AUSWAERTS BEARBEITUNG GEMAESS U...	6	0	291100049_1				Bat	
	65851_1	SCHMIDT, Mr. Uwe	SONDER	Datenkonvertierung Sonder-Teil für Teile o...	1	0						
ABTECH GMBH	93179_1	HEKTER, Mr. Kurt	9464.525/5	KABELVERSCHRAUBUNG M25 Ø11,1-19,9...	4	0	150600214_1	19.08.2011	26.09.2011			
AGILENT	56066_1	PECHMANN, Mr. Frank	9801.438/7	R-50C-011-3 - Agilent Kalibrierung Ref. zu ...	5	0		07.05.2008				
AGILENT	92430_1	PECHMANN, Mr. Frank	9801.438/7	Messwerterfassung 34980A zur Kalibrierung	1	0		25.07.2011	26.08.2011			
AGILENT	92430_2	PECHMANN, Mr. Frank	9801.438/7	40 Kanal Multiplexer Karte zur Überprüfung	1	0		25.07.2011	26.08.2011			
AGILENT	92430_3	PECHMANN, Mr. Frank	9801.438/7	MultiFunktionsmodul 34952 zur Kalibrierung	1	0		25.07.2011	26.08.2011			
AHLF	92150_1	SCHNEIDER, Mr. Stefan	SONDER	Schaltplanänderung für Daewoo 1	1	0		14.07.2011	05.08.2011			
ALF - MARTENS HAMB	56437_1	SCHNEIDER, Mr. Stefan	SONDER	Schaltplanänderung für Daewoo 1	1	0		14.07.2011	05.08.2011			
Sales Orders: 1139 #SO Lines: 3384 SO Value: 73.128 €k Average: 0,00 Count: 0 Sum: 0,00 Login: Autobahn Driver												

Derzeit offene Verkaufsaufträge

Fehlteilliste

Einkaufsaufträge oder Fertigungsaufträge

Erste Verwendung – Startformular



Autobahn - GE_Hamburg_FSG From EDC PROD

View Settings Order Tools Help

Eingabe der Suche. Find Next GE_Hamburg_FSG

Open Sales Orders - No Filters

Klicke auf Item, um Supply Demand zu erhalten.

Klicke auf Sequenz 1 bis 4, um die Detail der Fertigung oder des Einkaufes zu sehen.

Open Notifications: 2

Sh	Cust Order	Item No	Description	Ship Date	Request	Qty	OP1	OP2	OP3	OP4	Last Comment	Resp.	Project Name
1	410600047_3	1HT-410600047-2	SEAL SYSTEM API PLAN 52 (PROS)	28.02.2011	15.06.2011	2	580	405					
1	410600048_3	1HT-410600048-2	SEAL SYSTEM API PLAN 52 (PROS)	28.02.2011	15.06.2011	2	580	405					
35	110106654_1	1HT-110106654	KN301-3A + VNI12-75-4.G/G/G.1B.400-3PH.50	01.03.2011	25.03.2011	1	310	312	313	213			
	110600591_2	1H-FV	FRACHT UND VERPACKUNG	01.03.2011	16.03.2011	1					Organisation wechseln.		
1	340600040_1	.49246	ZYLINDERBLOCK	01.03.2011	11.04.2011	1	610	405	501	560			
1	450600063_1	1HT-450600063	MECHANICAL SEAL FOR PUMP P-605 A/B	01.03.2011	15.06.2011	2	580	405					
1	450600064_1	1HT-450600064	MECHANICAL SEAL FOR PUMP P-612	01.03.2011	15.06.2011	1	580	405					
1	450600065_1	1HT-450600065	MECHANICAL SEAL FOR PUMP P-615	01.03.2011	15.06.2011	1	580	405					
1	450600066_1	1HT-450600066	MECHANICAL SEAL FOR PUMP P-616	01.03.2011	15.06.2011	1	580	405					
1	450600067_1	1HT-450600067	MECHANICAL SEAL FOR PUMP P-617	01.03.2011	15.06.2011	1	580	405					
1	450600068_1	1HT-450600068	MECHANICAL SEAL FOR PUMP P-618 A/B	01.03.2011	15.06.2011	2	580	405					
24	130108511_1	1081.536/6	M10-600-2.3.Y(1).1.400/480-3PH.50/60.DIR.3.V*43.2880/3480...	02.03.2011	03.03.2011	1							
	341101613_1	GH82920208	PACKING SET	02.03.2011	20.04.2011	4							
1	340103273_1	GH84530161	FRAME	04.03.2011	01.04.2011	1	610	405	820	501			
81	110600577_1	1HT-110600577	20ENLP-1+1BL + MIP16-165-4.S/S/- .IS.3300-3PH.50	07.03.2011	08.04.2011	1	310	312	313	313			

Klicke auf die Auftragsnummer, um die Fehlteile zu sehen.

Neues Kommentar eingeben.

Öffnet Supply Demand in der Mitte.

Klicke auf die Kundennummer, um dieser in der oberen Tabelle heraus

Open Purchase Order Lines - No Filters

Buyer	Item No	Item Description	Project Name	Vendor	Sales Order	Printed Date	Qty Ordered	Promised Date	Qty Received	Last Comment
SCHNE...	1093.769/5	KEGELLEHRHUELSE Ø1008x130			150600179_2		1		0	
MARZA...	1076.035/8	LAGERRINGTRAEGER Ø130			130108443_1	24.04.2009	500		0	Test
MARZA...	1076.035/8	LAGERRINGTRAEGER Ø130			130108443_1	24.04.2009	1000		0	Test
HINRIC...	9006.525/3	LEITSCHAUFELGEHAUSE PN12 D...				24.02.2003	85		0	Test 3 3
HINRIC...	Z9005.962/9	LEITSCHAUFELGEHAUSE P10 DU...				24.02.2003	100		0	
SCHNE...	9457.403/8	VERSCHRAUBUNG GE 12-PLR					20		0	
SCHMI...	SONDER	Datenkonvertierung Sonder-Teil für ...					1		0	
JESSE...	9100.219/8	BUCHSE Ø198/168x175					2		0	
SCHNE...	9465.058/3	VERSCHRAUBUNG WB 90 AOL 40 HL					16		0	
Dörling...	BJ1008454	WIRE_MAG .059X .172 KAP-D				17.04.2008	110		0	
Dörling...	BJ1008454	WIRE_MAG .059X .172 KAP-D				17.04.2008	250		0	
Dörling...	BJ1008454	WIRE_MAG .059X .172 KAP-D				17.04.2008	500		0	

#Sales Orders: 995 #SO Lines: 3243 SO Value:113.522 €k

Login: Autobahn Driver



140106599_5	9700.038/3	AXIALLAGERRING Ø120/80X...	05.10.2010	04.02.2011	5											Cong Ty TNHH Ph...	352	MIN-MA
140106599_6	1064.615/7	AXIALLAGER Ø160 - - ST RL	05.10.2010	04.02.2011	5											Cong Ty TNHH Ph...	26	MABILE
140106599_7	9700.492/9	LAGERBUCHSE Ø55/72X60	05.10.2010	04.02.2011	80											Cong Ty TNHH Ph...	509	MIN-MA

Shortages For Order: 191100449_1

Reason Code	B/M	Item No	Description	Reqd	Job/PO	Needed By	MRP Date	OP1	OP2	OP3	OP4	OP5	Qty OH	QTY Oper	Start Date	Delay	Safety Stock	St Tj
RC4	B 1	1068.983/5	PASSFEDER 20X12X150 DIN6885*	2	84151_5	09.09.2010	10.12.2010	F. R...					1	10			0	Pu
	B 1	9083.863/3	BUCHSE Ø238/214	300	-	09.09.2010	07.12.2010						77				0	
	B 1	1077.550/5	KLEINTEILE FUER REPARATUR	50	-	09.09.2010	10.12.2010						-980				0	Pl
RC7	M 1	1088.824/9	LAUFRAD PN164E BZ NIALBZ	6	981059	09.09.2010	10.12.2010	510	725	717	717	725	0		27.09.2010		0	Di
RC7	M 1	1088.826/7	LAUFRAD PN164SE BZ NIALBZ	1	981061	09.09.2010	10.12.2010	510	725	717	717	725	0		29.09.2010		0	Di
	B 1	9084.397/0	BUCHSE Ø236/190	300	-	09.09.2010	07.12.2010						70				0	
RC7	M 1	1088.828/5	PUMPENWELLE PN16 I=7	1	981063	09.09.2010	10.12.2010	710	501	6	460		0		29.09.2010		0	Di
RC7	M 1	1088.838/4	KUPPLUNG *-F-Ø75FX300	1	981064	09.09.2010	10.12.2010	510	717	717			0		24.09.2010		0	Di
RC4	B 1	1091.803/8	FILTER VNIW22	1	84154_2	09.09.2010	16.12.2010	RIX...					1	1			0	Pu
RC7	M 2	1085.119/5	LAUFRING Ø219,5/209X20 NIALBZ	6	981054	25.08.2010	09.12.2010	620	405	720			-1		07.10.2010		0	Di

Aktion im unteren Feld aufrufen.

Open WIP Operation Sequences - No Filters

Dept	WC	Job	Item No	Description	Sales Order	Op Description	Last Comment	Qty Open	Needed By	Stat	Project Name	Planner
------	----	-----	---------	-------------	-------------	----------------	--------------	----------	-----------	------	--------------	---------



Um die derzeitigen Fehlteile für einen Kundenauftrag zu finden.

Finde den Auftrag

Klick auf Cust Order Zelle

Open Sales Orders - No Filters

	Sh	Cust Order	Type
		1000142_1	CHP Standard
	2	1000205_1	CHP Standard
	3	1000405_1	CHP Standard
		1000469_1	CHP Standard

Ansehen der Fehlteile

—

Shortages For Order: 1000205_1

	Item No.	Description
▶	P0289000	ROTOR JC 1.3;
	P0289000	ROTOR JC 1.3;

Springen zu PO und WIP

Klicke OP1 – OP5

	QTY Open	OP1	OP2
\$		JOHN	
		JOHN	

Ansicht der PO

Open Purchase Order Lines - No Filters

Buyer	Item No.
	P0289000
	P0288600
	P0288600

Ansicht des WIP Jobs

Klicke auf Job Number

Open WIP Operation Sequences - No Filters

	Dept	WC	Planner	Item No
	2008	IE *INF	CIC-S	981042
	2153	M500	CIC-S	959399

Öffnet die Details

Job	Stat	Plan	Qty Open	Qt Qu
466619_20	Released	40	40	0
466617_10	Unreleased	10	10	0
466614_10	Released	10	10	10
466614_20	Released	10	10	0
466614_30	Released	10	10	0
466617_20	Unreleased	10	10	0
466617_30	Unreleased	10	10	0
466615_10	Unreleased	3	3	0
466615_20	Unreleased	3	3	0
466615_30	Unreleased	3	3	0
466610_10	Released	6	6	6
466610_20	Released	6	6	0
466610_30	Released	6	6	0
466618_10				
466618_20				
B255776-0_30				
466609_10				



Um die Fehlteile unter Verwendung aller einzelnen Versorger zu kommunizieren und überwachen.

3	1000405_1	CHP Standard	5GASPOD0_385600_1	5GASPOD0 BARE PUMP	19.08.2010	19.08.2010	1	0	MI-GA	LINE-1	PB-A	PKG-A	LINE-A	1	Released 8
	1000469_1	CHP Standard	2K6XA-100P-DAL 422	Q41-G-410R 6/R	19.08.2010	20.08.2010	2	0	P-R	P&C			LINE-D	0	

Shortages For Order: 1000405_1

Item No.	Description	B/M	Reqd	Job/PO	MRP Date	Start Date	S	QTY Open	OP1	OP2	OP3	OP4	OP5	SS Qty	QTY OH	Reason Code	Needed By	Supply Type
98104200	GLD PKG 5&6GA	M 1	1	466619	03.09.2010	09.09.2010	Released	40	M633	IE*INF				10	0	RC7	11.08.2010	Discrete job
98929500	BODY 5 GAX	M 1	1	-	03.09.2010									7	6	RC5	11.08.2010	Planned order
98376675	BRKT MTG 5&6 GAS	M 1	1	-	03.09.2010									12	4	RC5	11.08.2010	Planned order

RC	Content
0	Fertigstellung der Stückliste liegt in der Vergangenheit
1	Geplanter Einkaufsauftrag mit zu verkürzender Lieferzeit
2	Fehlende Lieferbestätigung durch den Lieferanten 10 Tage nach Drucken des Auftrages
3	Termin der Lieferbestätigung ist später, als die Planung es benötigt.
4	Promised Date liegt in der Vergangenheit
5	Geplanter Fertigungsauftrag mit zu verkürzender Lieferzeit
6	Start date des Fertigungsauftrages liegt in der Vergangenheit
7	Fertigungsstellungsdatum des Fertigungsauftrages liegt in der Vergangenheit



Um den ersten Verkaufsauftrag zu finden, der den Einkaufs- oder Fertigungsauftrag ausgelöst hat.

Gehe zur unteren Tabelle

Klicke auf eine Sales Order

Open Purchase Order Lines - No Filters

	Buyer	Item No.	Item Description	Sales Order
►	Fretz,	SEAL	CHESTERTON.	1002702_1
	Fretz,	SEAL	INNER SEAL FOR 1	
	Fretz,	SEAL	INNER SEAL FOR 1	

Ansehen der Fehlteile

Open Sales Orders - No Filters

	Sh	Cust Order	Type	Item
	54	1002702_1	CHP Standard	3KGX4-160P-

<	
---	--

Shortages For Order: 1002702 Line: 1

	Item No.	Description	B/M	Reqd	J
►	CY50467A-ZH SHAFT GP3 FOR		M 1	10	-
	DY27463AC-D ADAPTER BRG HSG		M 1	10	-
	MY51019A160 IMPELLER		M 1	10	-
	DY53504A-D4 COVER FML GP3-16		B 1	10	P
	DY53504A-D4 COVER FML GP3-16		B 1	10	P
	DY53504A-D4 COVER FML GP3-16		B 1	10	-
	DY53504A-D4 COVER FML GP3-16		B 1	10	-




Um die Spalten filtern zu können und die Liste einzuschränken.

Gehe zur Tabelle

Rechtsklick auf die Überschrift


Open WIP Operation Sequences - No Filters

	Dept	WC	Planner	Item No.
	105	505	GIERZ	.04185
	105	505	GIERZ	.04185
	105	505	NIENAU	1HR-560100402-1




Filterart wählen

Linke Liste wählen



Suchwert eingeben

Rechte Liste wählen od. eingeben



Ergebnis ansehen

Custom Filter Applied: 41 / 14663 records displayed


	Dept	WC	Planner	Item No.
	105	561	MABILE	1078.005/9
	105	561	MABILE	1078.005/9



Um die Arbeit des Filtern für immer zu speichern.


Wähle das Menü des Formulars

Öffne die View (Linksklick)




Eingabe des Namens

Eingabe in der Liste




Speichern des Filters

Klick OK




Ansehen und anwenden des Filters

Right click on grid



View and apply filter

Right click on grid







Um die derzeitigen Filter zu verwalten und zu ändern.

Gehe zum Menü des Formulars


Klick auf Edit Filter Settings

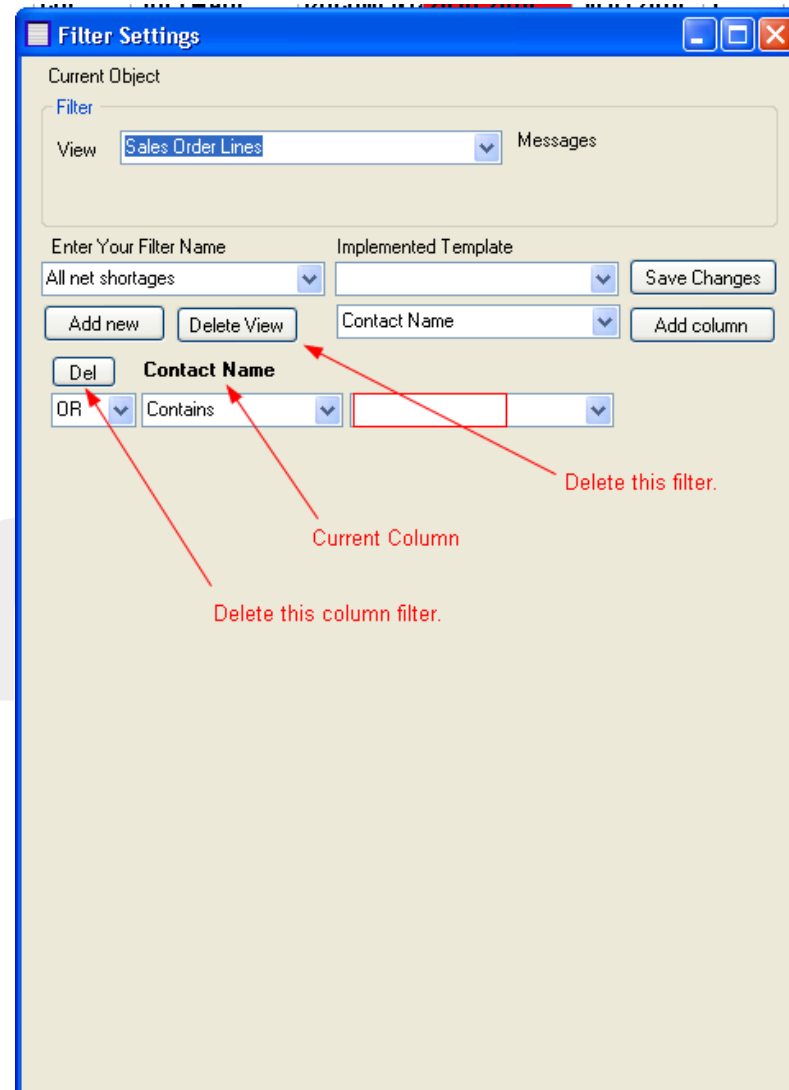



Gehe zur jeweiligen Tabelle


Rechtklick auf die Tabelle




Kundenaufträge



Einkaufaufträge



Fertigungsaufträge






Filter können auf jeder Ebene entwickelt werden (Für alle Fabriken, einzelne Fabrik, einzelner Nutzer). Beispiel: Hamburg Kundenaufträge für Ersatzteilgeschäft mit Fehlteilen und geplanten Versanddatum in der Vergangenheit.


Hamburg Sales Order Filter

Rechtsklick auf das Menü



Chesapeake Einkaufsaufträge

Rechtsklick auf das Menü.






In der oberen und unteren Tabelle kann ein Kommentar für Kunden-, Einkaufs- und Fertigungsaufträge eingegeben werden.


Gehe zur Last Comment Spalte

Linksklick auf das Feld

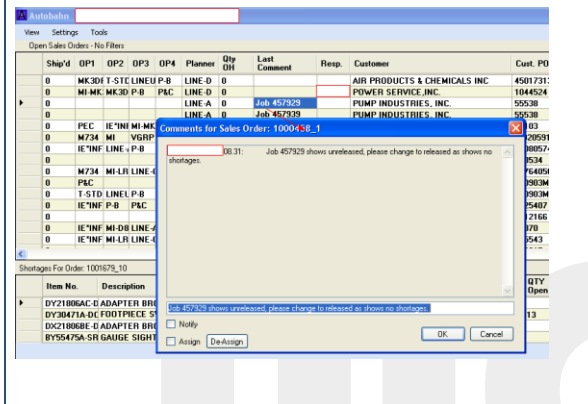


Dasselbe bei PO oder WIP

Linksklick auf das Feld

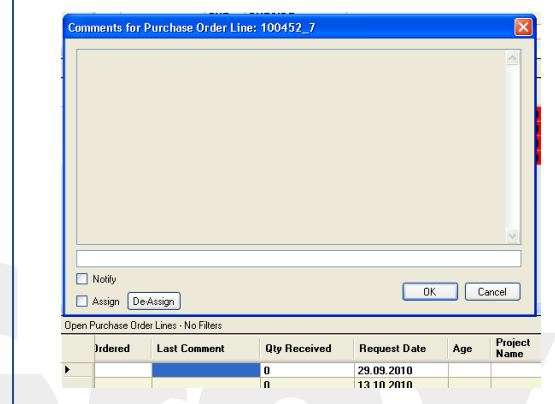


Eingabe des Kommentars

Klick auf OK

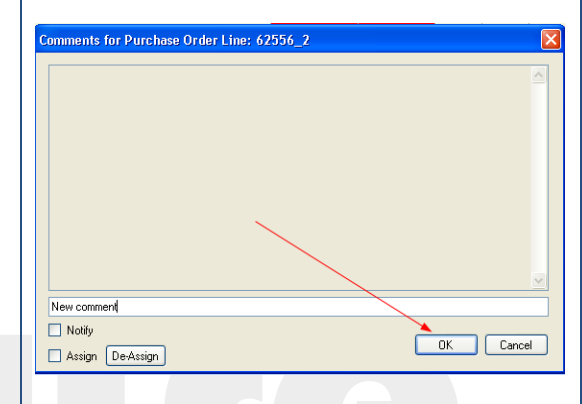

Der Dialog schlägt Vervollständigung vor.

Fange an zu schreiben

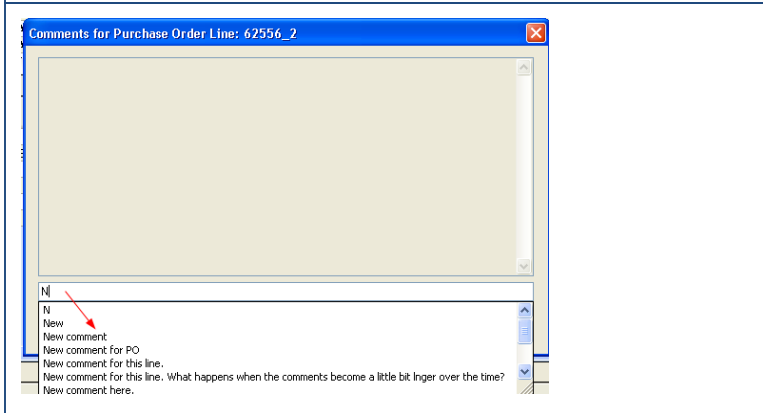


Autobahn speichert die Kommentare und wird niemanden erlauben sie später zu verändern.



Man kann andere Nutzer mit einem Kommentar benachrichtigen.


Gehe zur Last Comment Spalte

Linksklick auf das Feld

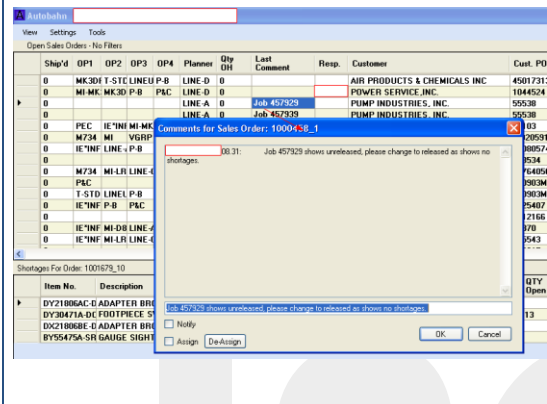


Notify

Anklicken von Notify



Eingabe des neuen Kommentares.

Klick OK




Die benachrichtigte Person wird das Tool blinken sehen und kann mit Linksklick das Kommentar und den Zusammenhang in der Planung erkennen.

Ansehen von Notizen

Linksklick auf Kommentare

457929	Find	Next	GE_Hamburg_FSG						
Open Notifications: 1									
Qty	Ship'd	OP1	OP2	OP3	OP4	Planner	Qty OH	Last Comment	Re
2010	1	0				MABILEA 0			
2010	1	0				MABILEA 0			
2010	1	0				MABILEA 0			
2010	1	0				MABILEA 0			
2010	1	0				MABILEA 0			
2010	1	0				MABILEA 0			
2010	1	0				MABILEA 0			
2010	1	0				MABILEA 0			
2010	1	0				MABILEA 0			
2010	1	0				MABILEA 0			
2010	1	0				MABILEA 0			
2010	1	0				MABILEA 0			
2010	1	0				MABILEA 0			
2010	3	0				MABILEA 0			
2011	5	0				MABILEA 0			

Ansehen der Diskussion

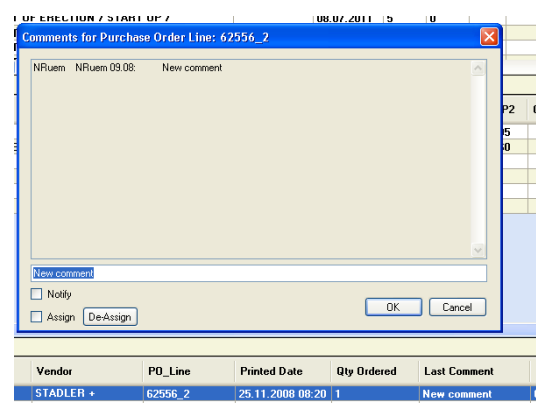


Verantwortlichkeit zuweisen



Man kann Verantwortlichkeit für einen Kundenauftrag zuweisen.


Gehe zu Last Comment

Linksklick auf das Feld

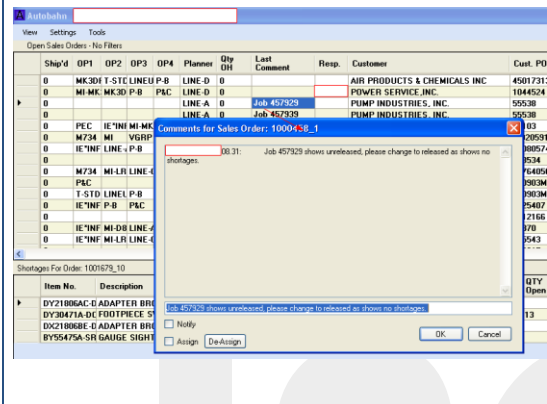


Benachrichtigen

Anklicken von Assign



Kick OK



Die jetzt verantwortliche Person wird in einer weiteren Spalte angezeigt, so dass darauf gefiltert werden kann.

Ansehen der Verantwortlichkeit

457929							
OP2	OP3	OP4	Planner	Qty OH	Last Comment	Resp.	Customer
			MABILEA 0		Change of	NRuemmel	Cong ty T
			MABILEA 0				Cong ty T
			MABILEA 0				Cong ty T



Die Suche wird alle Spalten innerhalb der offenen Verkaufs- Einkaufs- und Fertigungsaufträge durchsuchen.

Suchwerte eingeben

Linksklick auf Find

110 Find Next

Line: 1 of 8960

Qty OH	Last Comment	Resp.	Customer
	Change of	NRuemmeli	Cong ty TNHH Phong Viet
			Cong ty TNHH Phong Viet
			Cong ty TNHH Phong Viet
			Eng. SA'D YAHYA ODEH
			badenova - Germany - Fre
			AQUA INZENJERING

Erstes auffinden ansehen

Linksklick auf Find

Autobahn - GE_Hamburg_FSG From EDC PROD

View Settings Tools 110 Find Next

Open Sales Orders - No Filters Line: 1 of 8960

Sh	Cust Order	Type	Item	Description	Ship Date	Req	Qty	Ship'd	OP1	OP2	OP3	OP4	Planner	Qty OH
	110106523_1	HMB-P1	1HT-110106523	QN101-5A +		15.12.2010	1	0					MABILEA 0	
	110106523_3	HMB-P1	1HT-110106523-2	SET OF RECOMMENDED SPARES - PUMP		15.12.2010	1	0					MABILEA 0	
	110106523_4	HMB-P1	1HT-110106523-3	SET OF RECOMMENDED SPARES - MOTOR		15.12.2010	1	0					MABILEA 0	
	110106526_1	HMB-P1	1HT-110106526	PN82-22A +		14.10.2010	1	0					MABILEA 0	
	110106529_1	HMB-P1	1HT-110106529	QN101-5A +		14.10.2010	1	0					MABILEA 0	
	110106531_1	HMB-P1	1HT-110106531	QN103-5A +		12.11.2010	1	0					MABILEA 0	
	110600396_13	HMB-P1	1HT-110600396-5	START-UP, TEST RUN, TRAILS		01.06.2009	1	0					MABILEA 0	
	110600397_11	HMB-P1	1HT-110600397-3	FIELD SERVICES ASSISTANCE DURING		01.06.2009	1	0					MABILEA 0	
	110600397_12	HMB-P1	1HT-110600397-4	TECHNICAL SUPPORT / ASSISTANCE ON		01.06.2009	1	0					MABILEA 0	
	110600397_13	HMB-P1	1HT-110600397-5	START-UP, TEST RUN, TRAILS		01.06.2009	1	0					MABILEA 0	

Nächsten Wert ansehen

Linksklick auf Next

110 Find Next G

Line: 29 of 8960

	Penalty Clause	L/C Ship Date	Flowserve Number	Max Dam
2	1105	AMERICAN		
5	1105	AMERICAN		
6	1105	GERMAN		
6	1105	GERMAN		
6	1105	GERMAN		
6	1105	GERMAN		



You can hold control and left click on multiple columns to sort on different criterias.

Drücke Strg

Linksklicke mehrere Spalten

Autobahn - GE_Hamburg_FSG From EDC PROD

View Settings Tools Help

Open Sales Orders - No Filters Sorted By Sh,Cust Order,Item No

	Sh	Cust Order	Item No	Description	Ship Date	Request
▶		110105190_7	ANZAHLUNG	PARTIAL PAYMENT	12.09.2008	26.09.2008
		110105190_8	ABSCHLUSS	PAYMENT ON DELIVERY	12.09.2008	26.09.2008
		110105352_2	1H-FV	FRACHT UND VERPACKUNG	17.12.2008	18.12.2008
		110105568_3	ANZAHLUNG	PARTIAL PAYMENT	26.05.2009	05.06.2009
		110105568_4	ANZAHLUNG	PARTIAL PAYMENT	26.05.2009	05.06.2009
		110105568_5	ABSCHLUSS	PAYMENT ON DELIVERY	26.05.2009	05.06.2009
		110105569_3	ANZAHLUNG	PARTIAL PAYMENT	26.05.2009	05.06.2009
		110105569_4	ANZAHLUNG	PARTIAL PAYMENT	26.05.2009	05.06.2009
		110105569_5	ABSCHLUSS	PAYMENT ON DELIVERY	26.05.2009	05.06.2009



Am unteren Ende des Formulars lassen sich Kalkulationen erkennen.

Wähle mehrer Zellen

Linke Maustaste gedrückt

	Request	Qty	OP1
2008	26.09.2008	30	
2008	26.09.2008	70	
2008	18.12.2008	1	
2009	05.06.2009	15	
2009	05.06.2009	35	
2009	05.06.2009	50	
2009	05.06.2009	15	
2009	05.06.2009	35	
2009	05.06.2009	50	
2012	20.10.2009	1	

Ansehen des Ergebnisses

Am unteren Ende des Formulars

0	40
0	30
Average: 33,44 Count: 9 Sum: 301,00	

Kundenaufträge 1 / 4



Open Sales Orders - No Filters

Open Notifications: 0

	Sh	Cust Order	Type	Item	Description	Ship Date	Req	Qty	Ship'd	OP1	OP2	OP3	OP4	Planner	Qty OH	Last Comment
▶	1	100093_7	CHP Standard	SOFTWARE	DOCUMENTATION REQ'D BY	6 2009	7 2010	8	0	9	10		11	12	13	14
		100093_7_42	CHP Standard	SPARES-MARK 3	MARK 3 SPARES	17.08.2009	17.08.2009	1	0						6	
		1001819_1	CHP Drop Ship	DRIVER	DEN06618	17.08.2009	17.08.2009	1	0					ZXD	178	
		1000329_2	CHP Standard	SPARES-MARK 3	E141-040TB	23.11.2009	15.09.2010	1	0						6	
		1001815_5	CHP Standard	SOFTWARE	DOCUMENTATION REQ'D BY	10.12.2009	30.09.2010	1	0					XXX	339	
		1001837_1	CHP Drop Ship	DRIVER	UJ25S1AM	15.12.2009	15.12.2009	4	0					ZXD	178	
		1000296_5	CHP Standard	SOFTWARE	DOCUMENTATION REQ'D BY	20.01.2010	30.09.2010	1	0					XXX	339	
		1000277_45	CHP Standard	SPARES-MARK 3	MARK 3 SPARES	30.01.2010	15.09.2010	1	0						6	
		1000277_46	CHP Standard	SPARES-MARK 3	MARK 3 SPARES	30.01.2010	15.09.2010	2	0						6	
		1000277_34	CHP Standard	SPARES-MARK 3	SPARES FOR TAG FLP19	15.02.2010	15.09.2010	1	0						6	
		1000677_9	CHP Standard	START-UP MARK	START-UP SERVICE	01.03.2010	22.02.2022	1	0					LINE-D	0	
		1001649_10	CHP Standard	MISC-AS	MISC SPECIAL	23.03.2010	30.09.2010	1	0					ZXM	1	
		1001648_170	CHP Standard	MISC-AS	MISC SPECIAL	29.03.2010	30.09.2010	2	0	FLOW?				ZXM	1	
		1000663_1	CHP Warranty	OUTSIDE	OUTSIDE PROCESSING	31.03.2010	30.09.2010	2	0					ZXK	26	
		1001625_10	CHP Standard	BY50424F-TSSR	SEAL OIL GP3 IB & OB	27.04.2010	11.11.2011	4	0					SEB	356	

Nr.	Inhalt
1	Anzahl der Fehlteile unterhalb dieses Produktes
2	Kundenauftragsnummer _ Zeile des Kundenauftrages
3	Art des Auftrages
4	Produkt für den Kunden
5	Beschreibung des Produktes
6	Versanddatum des Produktes
7	Datum an dem der Kunde das Produkt angefragt hat
8	Menge die Versand werden soll
9	Menge, die bereits versendet wurde
10	Lieferant des Einkaufsauftrages oder die nächste Ressource die diese Teilenummer herstellt
11	Wenn der Fertigungsauftrag bei Schritt 3 von 12 wird hier die Ressource von Schritt 6 angezeigt
12	Planer für diese Teilenummer
13	Menge auf Lager für diese Teilenummer
14	Letztes eingegebenes Kommentar für diese Teilenummer



Open Sales Orders - No Filters

Open Notifications: 0

	Resp.	Customer	Cust. PO	Freight Code	Freight Terms	Job/PO	S	Start	Qty	Rel Date	Extended Price	Ordered Date	Order Source
▶	15	GE WATER & PROCESS	1762	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		STONE & WEBSTER ENG. CORP.	1731P11002									17.08.2008	Conversion_CHI
		ALASKA ROTEQ CORP	0114200	BULK	FOB						390	17.08.2009	Conversion_CHI
		DOW CHEMICAL	8091360	BULK	FOB						4779	22.06.2009	Conversion_CHI
		SAMSUNG TEXAS CONSTRUCTION INC	E20090361042	BULK	FOB						0	30.11.2009	Conversion_CHI
	RHodde	INDUSTRIAL PROCESS EQUIP GROUP	1076432	BULK	FOB						3604	10.12.2009	Conversion_CHI
		SAMSUNG TEXAS CONSTRUCTION INC	E2009036-1035	BULK	FOB						0	19.11.2009	Conversion_CHI
		STONE & WEBSTER ENG. CORP.	127731P11002	BULK	TBD						525	28.07.2008	Conversion_CHI
		STONE & WEBSTER ENG. CORP.	127731P11002	BULK	TBD						1560	28.07.2008	Conversion_CHI
		STONE & WEBSTER ENG. CORP.	127731P11002	BULK	TBD						2827,5	28.07.2008	Conversion_CHI
		O'BRIEN & GERE/CROWDER JV	407180016	BULK	FOB						2500	03.06.2009	Conversion_CHI
		NEUMAN & ESSER USA INC	6761	BULK	TBD						409,5	22.03.2010	FASTRAQ
		EXXONMOBIL CORP	4512301092	BULK	TBD	P467057_1	OPEN				2400	01.03.2010	FASTRAQ
		DIVERSIFIED PUMP & COMPRESSOR	4343	BULK	TBD						0	17.03.2010	Conversion_CHI
		BARIVEN, S. A.	5100077509 NO	BULK	TBD						187,6	01.02.2010	FASTRAQ

Nr.	Inhalt
15	Derzeit eingegebene Verantwortlichkeit für diesen Auftrag
16	Kundenname
17	Nummer des Kunden für den Auftrag
18	Code für die Transportart
19	Lieferkonditionen
20	Nummer für den Fertigungs- oder Einkaufsauftrag für das Produkt
21	Status des Fertigungs- oder Einkaufsauftrages
22	Startdatum für den Fertigungsauftrag
23	Menge für den Fertigungsauftrag
24	Datum an dem der Fertigungsauftrag freigegeben wurde
25	Gesamtpreis für diese Line im Auftrag
26	Datum an dem die Order durch den Kunden platziert wurde
27	Quelle der Order



Open Sales Orders - No Filters

Open Notifications: 0

	Project Name	Sales Type	Spare Class	Product Code	Ind Paint Parts	Flow Status Code	Contact Name	Quotation Number	Penalty Clause	L/C Ship Date	Flowserve Number	Max. Liq. Dam.
▶	100033-7	AM	0	MISC.ARTICLE OF		AWAITING_SHIPPING	James, Berning				0418	
	100037-42	TTU	0	MARK 3		AWAITING_SHIPPING	James, Berning				05040356	
	1001819-1	ACCESS	0	DRIVER.MOTORS.		AWAITING_RECEIPT					45214200	
	1000329-2	TTU	0	MARK 3		AWAITING_SHIPPING	James, Berning				02680915	
	1001815-5	AM	0	MISC.ARTICLE OF		AWAITING_SHIPPING	James, Berning				02540454	
	1001837-1	ACCESS	0	DRIVER.MOTORS.		AWAITING_RECEIPT					45176432	
	1000296-5	AM	0	MISC.ARTICLE OF		AWAITING_SHIPPING	James, Berning				02540452	
	1000277-45	TTU	0	MARK 3		AWAITING_SHIPPING	James, Berning				05040356	
	1000277-46	TTU	0	MARK 3		AWAITING_SHIPPING	James, Berning				05040356	
	1000277-34	TTU	0	MARK 3		AWAITING_SHIPPING	James, Berning				05040356	
	1000677-9	OE		MARK 3		AWAITING_SHIPPING	Matthew,				07060630	
	1001649-10	AM	0	MARK II		AWAITING_SHIPPING					07678178	
	1001648-170	AM	0	MARK II		AWAITING_SHIPPING					07677744	
	1000663-1	AM	2	MISC.ARTICLE OF		AWAITING_SHIPPING					510CS147	
		AM	1	MARK 3		AWAITING_SHIPPING					36196645	

Nr.	Inhalt
28	Name des Projektes, wenn eine Seiban Nummer dazu angelegt wurde
29	Verkaufstyp
30	Ersatzteilkategorie
31	Produktcode
32	Kategorie für Ind Paint Parts
33	Flow Status Code der Linie im Verkaufsauftrag
34	Kontaktname für den Kunden
35	Angebotsnummer für den Kunden
36	Vereinbart Art der Vertragsstrafe
37	Versanddatum der Rechnung
38	Global Flowserve Nummer für diesen Auftrag
39	Maximaler Liquidierungsschaden für diesen Auftrag



Exp. Liq. d Dam.	Sales App Number	Shipment Priority	Context	Cust. Type	Unit Acc. Value	Trade Account
40	41	42	43	44	45	46
		Standard	US FSG	R	0	0000
		Standard	US FSG	R	0	0000
		Standard	US FSG	R	0	0000
		Standard	US FSG	R	0	0000
		Standard	US FSG	R	0	0000
		Standard	US FSG	R	0	0000
		Standard	US FSG	R	0	0000
		Standard	US FSG	R	0	0000
		Standard	US FSG	R	0	0000
		Standard	US FSG	R	0	0000
		Standard	US FSG	R	0	0000
		Standard	US FSG	R	0	0000
		Standard	US FSG	R	0	0000
		Standard	US FSG	R	0	0000
		Standard	US FSG	R	0	0000
		Standard	US FSG	R	0	0000

Nr.	Inhalt
40	Erwarteter Liequidierungsschaden
41	Nummer der der verwendeten Verkaufspolitik
42	Priorität des Versandes
43	Context des Kundenauftrages
44	Art des Kunden: I – Schwester, R – Kunde
45	Driver/Accessories Value from sales order line flexfield
46	Nummer des Buchungskontos



Shortages For Order: 550600043_1

	Item No.	Description	B/M	Reqd	Job/PO	MRP Date	Start Date	S	QTY Open	OP1	OP2	OP3	OP4	OP5	SS Qty	QTY OH	Reason Code	Delay
	1HT 600043-11	2-YEAR SPARE PARTS	3	4	904451	06.09.2010	15.01.2010	Unreleased	9	10	11				12	13	RC7	239
	1HT 600035-17	SPARE FOR DRILL STEM DRIVE	3	4	804451	06.09.2010	12.01.2009	Released	1	5	4				0	0	RC1	99
	1HPK002080	ERSATZTEILE	M 3	1	904451	03.09.2010	12.01.2010	Released	1	580					0	1	RC7	239
	1HGK002367	FIRE SEALS SET FOR DRAIN	B 2	1		06.09.2010									0	0	RC1	99
▶	1HGK001912	SPARE PARTS	B 2	1	62556_2	06.09.2010				STADLER					0	0	RC3	24
	1HGK002526	SPARE PARTS FOR HPU	B 2	1	75657_1	06.09.2010				LIPPOLD					0	0	RC4	100

Nr.	Inhalt
1	Teilenummer des Fehlteiles
2	Beschreibung der Teilenummer
3	B – Kaufteil ; M – Fertigungsteil; B 3 – Kaufteil auf Level 3
4	Menge, die für diesen Job angefragt wurde.
5	Nummer des Fertigungs- oder Einkaufsauftrages
6	Das Planungsdatum von MRP
7	Startdatum des Fertigungsauftrages
8	Status des Fertigungsauftrages
9	Offene Menge des Fertigungsauftrages
10	Ressource der nächste Operationssequenz des Fertigungsauftrages oder Lieferant bei einem Einkaufsauftrag
11	Ressource der übernächsten offenen Operationssequenz
12	Menge des Sicherheitsbestandes
13	Derzeitige Menge auf Lager für dieses Teil
14	Reason code falls der Fertigungs- oder Einkaufsauftrag Probleme hat
15	Theoretische Verspätung des Auftrages



Supply Type	Item Status	Needed By
Discrete job	Active	20.01.2010
Discrete job	Active	15.01.2010
Discrete job	Active	18.01.2010
Planned order	Active	19.01.2010
Purchase order	Active	19.01.2010
Purchase order	Active	19.01.2010

Nr.	Inhalt
16	Art des Auftrages für dieses Teil
17	Status des Teiles für diesen Auftrag
18	Wann wird dieses Teil spätestens benötigt

INGravure



Open WIP Operation Sequences - No Filters

	Dept	WC	Planner	Item No.	Description	Sales Order	Party Name	Job	Stat	Plan	Qty Open	Qty in Queue	Hours Open
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	105	505	GIERZ	.04185	KREUZKOPF			868791_30	Released	35	15	0	
	105	505	GIERZ	.04185	KREUZKOPF			868791_50	Released	35	15	0	
	105	505	GIERZ	.04185	KREUZKOPF			868791_70	Released	35	15	0	

Nr.	Inhalt
1	Kostenstelle für diese Operationssequenz
2	Zelle in dem dieser Schritt stattfindet
3	Planer für diese Teilenummer
4	Teilenumme
5	Beschreibung dieser Teilenummer
6	Kundenauftrag für diesen Fertigungsauftrag
7	Name des Kunden für diesen Fertigungsauftrag
8	Nummer des Fertigungsauftrages
9	Status des Fertigungsauftrages
10	Geplante Menge des Auftrages
11	Offene Menge des Auftrages
12	Menge in der Warteschlange des Auftrages
13	Offene Stunden des Auftrages



Open WIP Operation Sequences - No Filters

	Op Start	Last Comment	Project Name	Material Code	Operation Due	Qty Available	Needed By	Sequence Indicator	Total Demand	Avg. 10 Days	3 Month Usage	6 Month Usage	12 Month Usage
▶	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	15.04.2009				16.04.2009 08:53	0			5				
	22.04.2009				23.04.2009 07:08	0			5				
	29.04.2009				30.04.2009 16:58	0			5				
	23.11.2009				23.11.2009 07:00	0	25.01.2010		1				
	25.11.2009				25.11.2009 07:00	0	25.01.2010		1				

Nr.	Inhalt
14	Startdatum der Operationssequenz
15	Letztes Kommentar der Operationssequenz
16	Projektname, falls eine Seiban Nummer verwendet wird
17	Materialcode dieser Teilenummer
18	Datum der Abarbeitung
19	Verfügbare Menge für diese Teilenummer
20	Spätestes Lieferdatum des Teiles
21	Indikator, ob es sich bei dieser Operationssequenz um die letzte handelt
22	Gesamtbedarf dieser Teilenummer
23	Durchschnittlicher Bedarf der letzten 10 Tage
24	Durchschnittlicher Bedarf der letzten 3 Monate
25	Durchschnittlicher Bedarf der letzten 6 Monate
26	Durchschnittlicher Bedarf der letzten 12 Monate



	Buyer	Item No.	Item Description	Sales Order	Vendor	PO_Line	Printed Date	Qty Ordered	Last Comment	Qty Received	Request Date
	SCHNEIDER,	1HSP00837	VENTIL HEBELARM		LIPPOLD	79445_8	13.04.2010 13:02	1		0	20.08.2011
	SCHNEIDER,	1HSP00838	VENTIL HEBELARM		LIPPOLD	79445_8	13.04.2010 13:02	2		0	20.08.2011
	SCHNEIDER,	1HSP002908	VENTIL HEBELARM		LIPPOLD	79445_8	13.04.2010 13:02	2		0	20.08.2011

Nr.	Inhalt
1	Einkäufer für die Teilenummer
2	Teilenummer
3	Beschreibung des Teiles
4	Erster auslösender Kundenauftrag
5	Lieferant
6	Nummer des Einkaufsauftrages _ Zeilennummer
7	Druckdatum des Auftrages
8	Menge, die gekauft wurde
9	Letztes Kommentar für diese Zeile
10	Menge, die bereits von diesem Auftrag empfangen wurde
11	Datum des angefragten Lieferdatums




Age	Project Name	Material Code	Email	Phone	Contact	Promised Date	Commodity Code	Qty Available	Needed By	F Lead Time	SS Qty	Approved
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
16						08.09.2010		0	27.08.2010		0	Y
105						08.09.2010		0	27.08.2010		0	Y

Nr.	Inhalt
12	Zeit zwischen Druckdatum und Heute
13	Projektname oder Seiban Nummer
14	Material Code der Teilenummer
15	Email des Lieferanten
16	Telefonnummer des Lieferanten
17	Name des Kontaktes
18	Versprochenes Lieferdatum
19	Gruppierung der Teilenummer
20	Derzeit verfügbare Menge der Teilenummer
21	Datum an dem das Teil spätestens benötigt wird
22	Feste Lieferzeit für dieses Teil
23	Sicherheitsbestand dieser Teilenummer
24	Indikator, ob dieser Auftrag genehmigt wurde



	Job	Ope	WC	Plan	Queue	Scrap	Complete	L Moved	Comment
▶	906052	2	44	1	0	0	0		
	906052	30	44	1	0	0	0		
	906052	40	44	1	0	0	0		
	906052	99	736	1	0	0	0		
	906052	101	505	1	0	0	0		
	906052	102	560	1	0	0	0		
	906052	103	505	1	0	0	0		
	906052	104	510	1	0	0	0		
	906052	150	44	1	0	0	0		

Nr.	Inhalt
1	Nummer des Fertigungsauftrages
2	Operationssequenz
3	Center der Resource
4	Geplante Menge des Auftrages
5	Menge in der Warteschlange der Maschine
6	Verworfenene Menge
7	Gefertigte Menge
8	Letzte Datum, an dem der Auftrag bewegt wurde
9	Kommentare für diesen Auftrag



Entry	Aktion	Sinn
Filter	Filter für die persönlich interessante Liste	Jeden Tag die interessanten Aufträge ansehen
Export to XML	Export zu allen Tabellenkalkulationsprogrammen	Ausdrucken und speichern der Daten
Reload Grid	Neu laden der Tabelle	Neustart des Programmes
Copy Cell Or Rows To Clipboard	Kopiert die Zelle zum Klipboard	Kopieren des Wertes in andere Programme



Shortages For Order: 1000514_1

	Item No.	Description
▶	60626842	IMPELLER ADAPTOR
	7551	230
	6057	
	60626842	IMPELLER ADAPTOR

	Copy Cell Or Rows To Clipboard
	Export to XML

Entry	Aktion	Sinn
Export to XML	Export zu allen Tabellenkalkulationsprogrammen	Ausdrucken und speichern der Daten
Copy Cell Or Rows To Clipboard	Kopiert die Zelle zum Klipboard	Kopieren des Wertes in andere Programme

INGravure



Open Purchase Order Lines - No Filters

	Item No.	Item Description	Sales Order	Vendor	PO_Line	Price
▶	SEAL	Copy Expedite Msg to Clipboard		A W CHESTERTON	P466118_1	18.0
	SEAL	Copy Cell or Row		A W CHESTERTON	P466118_3	18.0
	SEAL	Change Grid		A W CHESTERTON	P466118_4	18.0
	SEAL	PO Filter				
	SEAL	Export to XML				
	DRIVER	DRIVER ALL TYPES	100			
	SOFTWARE	DOCUMENTATION	100			

All
 Promised Date Or Needed By Date < Today + 30 Days
 RC2 Missing Promised Date
 RC3 Promised Date > Need By Date
 RC4 Past Due Promised Date

Entry	Action	Purpose
Copy Expedite Msg to Clipboard	Kopiert ein strukturiertes Bündel an Informationen zum Clipboard	Einkaufsaufträge überwachen
Copy Cell Or Rows To Clipboard	Kopiert die Zelle zum Klipboard	Kopieren des Wertes in andere Programme
Change Grid	Wechseln des Inhaltes der Tabelle	Wechsel zwischen Einkauf und Fertigung
PO Filter	Filter für die persönlich interessante Liste	Jeden Tag die interessanten Aufträge ansehen
Export to XML	Export zu allen Tabellenkalkulationsprogrammen	Ausdrucken und speichern der Daten




Open WIP Operation Sequences - No Filters

	Dept	WC	Planner	Item No.	Description	Sales Order
▶						
	2001	MI-				
	2012	P&C				
	2020	MI				
	2020	MI				
	2020	MI-				
	2020	D10				

WIP Filter	▶	All
Change Grid		RC6 Past Due Start Date
Export to XML		RC7 Past Due Completion Date
Copy Cell Or Rows To Clipboard		

Entry	Action	Purpose
WIP Filter	Filter für die persönlich interessante Liste	Jeden Tag die interessanten Aufträge ansehen
Change Grid	Wechseln des Inhaltes der Tabelle	Wechsel zwischen Einkauf und Fertigung
Export to XML	Export zu allen Tabellenkalkulationsprogrammen	Ausdrucken und speichern der Daten
Copy Cell Or Rows To Clipboard	Kopiert die Zelle zum Klipboard	Kopieren des Wertes in andere Programme



Verschiedene Organisationen sind verfügbar über die Anwendung.


INGravure

Installation der Anwendung




Öffne folgenden Ordner

Start > Ausführen




Starte die Anwendung

Start > All Programs >
Flowserve

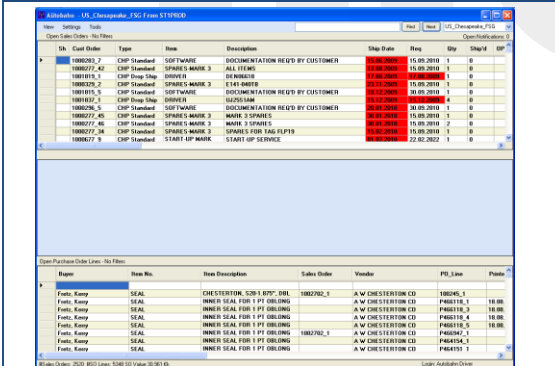


Starte die Installation

Doppelklick auf publish.htm

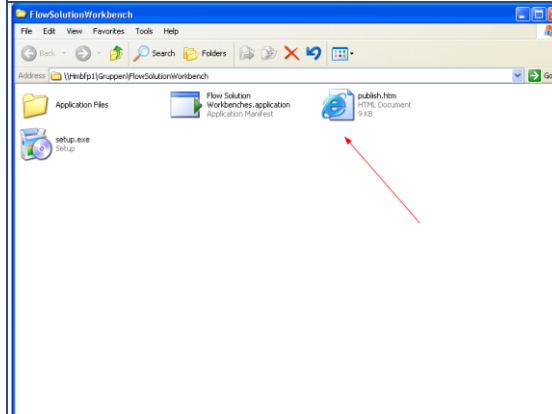

Starte die Installation

Klick install

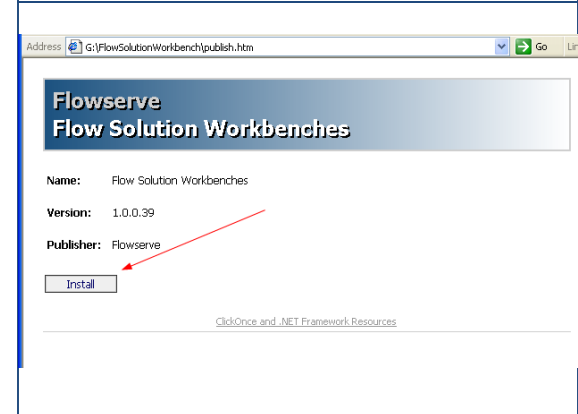

Auf Windows XP Maschinen wir eventuell das .NET
Framework 3.5 installiert.


Pfad: \\Hmbfp1\Gruppen\FlowSolutionWorkbench



Die Anwendung sucht nach jedem Start nach neuen Updates.


Starte the application

Start > Alle Programme > Flowserve
> Flow Solution Workbench




Installation des Updates


Klick OK



Warte auf das Update



Die Anwendung startet





Linkklick
auf die Zeilen
ermöglicht
springen auf
der Autobahn

Discussion Tracking

Out Of Office Agent

I was notified I notified My comments

No of Records 100

Comment	Creation Date	Creation Name	Notification To
SHIPPED 04-26 ...	28.05.2011 10:52		
SHIPPED 04-25 ...	28.05.2011 10:51		
has not been ent...	28.05.2011 10:50		
has not been ent...	28.05.2011 10:47		
shipped 4/21	28.05.2011 10:44		
shipped 4/21	28.05.2011 10:44		
w/s 5/5	28.05.2011 10:41		
Amy - please req...	26.05.2011 17:35		
ERS 38217 Shea...	26.05.2011 17:32		
ERS 38216 Shea...	26.05.2011 17:32		
E-Mail sent to W...	26.05.2011 17:24		
There are 34 in st...	26.05.2011 17:15		
Need 17 more th...	26.05.2011 17:11		
Connie - received...	26.05.2011 17:09		
Unreleased Avail...	26.05.2011 17:09		
HERE 5 shafts i...	26.05.2011 17:03		
Randy the only s...	26.05.2011 16:57		
Order has been b...	26.05.2011 16:56		

28.05: SHIPPED 04-26 FROM FORT SMITH, AR. ON SEFL, PRO # 551304758

28.05: SHIPPED 04-25 FROM FORT SMITH, AR ON SEFL, PRO # 551308095

28.05: has not been entered yet

28.05: has not been entered yet

28.05: shipped 4/21

28.05: shipped 4/21

28.05: w/s 5/5

Amy - please request supplier for pod on the 5/16 delivery. Have they ship that?

TV

28.05: E-Mail sent to Woods requesting status 5/26/11 & you were copied.

There are 34 in stock. I'll run more next week

28.05: Need 17 more than what is on hand by 6/6. Please expedite

28.05: Connie - received 1 pc on 5/4/2011, can vendor provide POD for second pc on this PO, I don't see any PO receipts for it.

Unreleased Available please complete by 6/8

28.05: please expedite & advise best delivery - also verify qty 8 will ship

Amy - please update the status of this order. Please see if they can partial ship

Derzeitige
Unterhaltung

I was notified

Ansehen von Notizen von
anderen.

I notified


Ansehen der eigenen Notizen
an andere.

My comments

Ansehen der eigenen
Kommentare.


Find

Volltextsuche auf alle Spalten,
außer Datum.



Out Of Office Agent > Check User > Setup out of office status

Gibt einen neuen Status in der Notify Liste, womit angezeigt wird, wann man wieder erreichbar ist.





Comments for Sales Order: 130107642_5

Ruemmeli Nils to
 04.04: Uli: Was ist mit der 1hfv?

Ruemmeli Nils 10.05: Nils, Frachtposition wurde von der SPE nicht gepickt

10.05: Bettina, bitte picken und Rechnung für Frachtposition erstellen

10.05: Uli: Die Spedi kann nicht picken. Hierfür bitte Manfred Baumann ansprechen.

Uli: Die Spedi kann nicht picken. Hierfür bitte Manfred Baumann ansprechen.

☐ Notify

☐ Assign

Action

Action

Eine Standardaktion auswählen können.

Notify

Öffnet eine Liste mit allen Anwesenden der Fabrik.

Assign

Verantwortlichkeit für eine Kundenorder.


OK

Neues Kommentar speichern.



Organisationen

Grafik kontrollieren

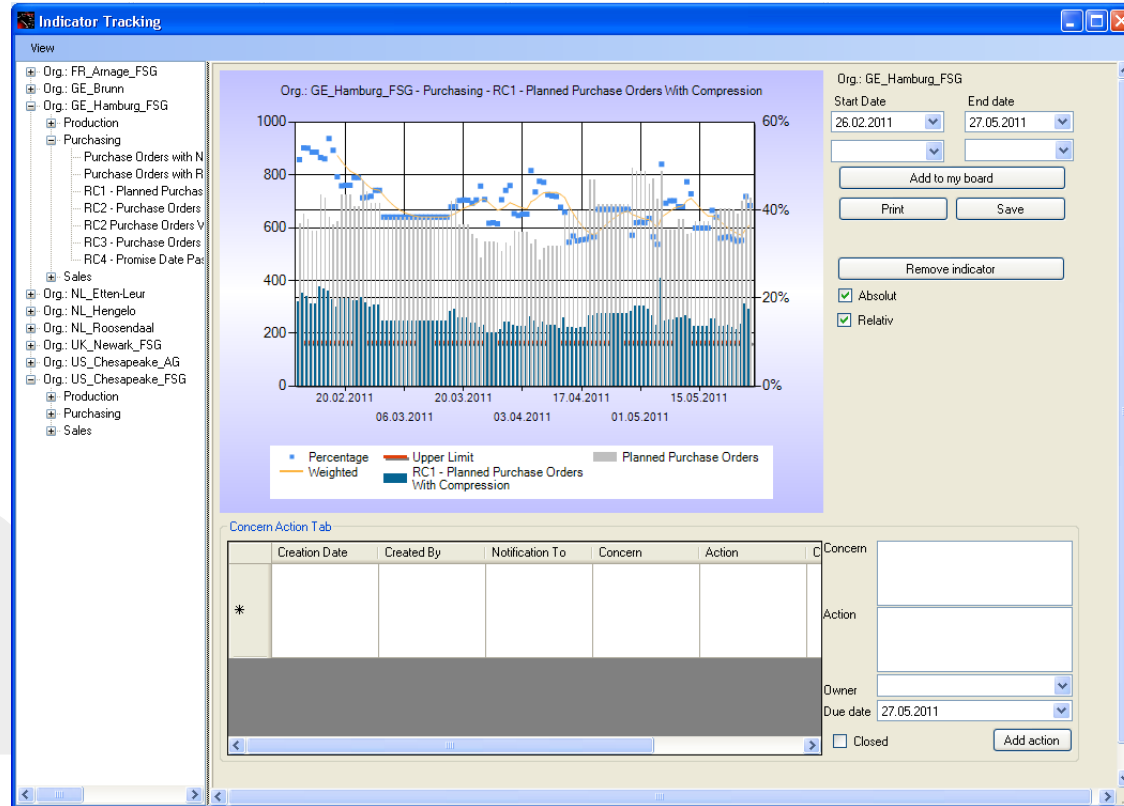


Kernfunktionen:

- Tägliche Ablichtung
- Unterschiedliche Einheiten mit derselben Messung versehen
- Aktionen an einem Platz verwalten und täglich die Leistung überwachen
- Automatische Erstellung der Grafik
- < Sekunde, um die Informationen abzufragen




Indicator Tracking auswählen

Tools > Indicator Tracking




Remove dashboard

Klicke remove screen




Öffnen des Baumes

Klick auf +




Trend ansehen

Doppelklick auf einen Knoten

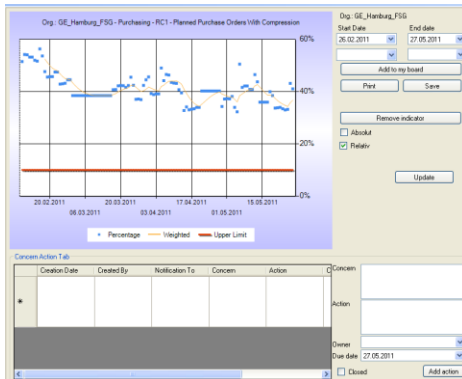

Indicator Tracking – User Control

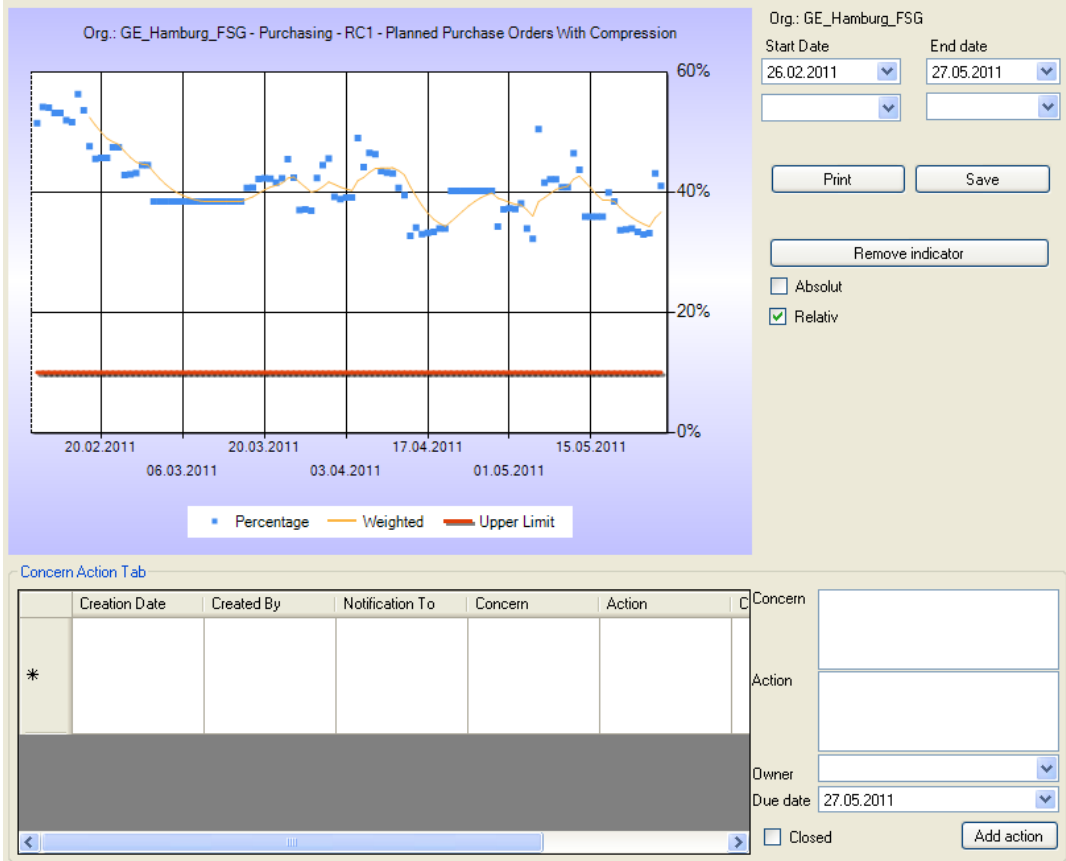

Save

Speichert das Bild für eventuelle Handouts in der Fabrik.

Print

Druckt das Bild, sowie die Maßnahmenliste.

Remove indicator


Indikator wird wegbewegt.

Absolut / Relativ


Zeigt absolute und relative trends an.



Central Order Planning Workbench

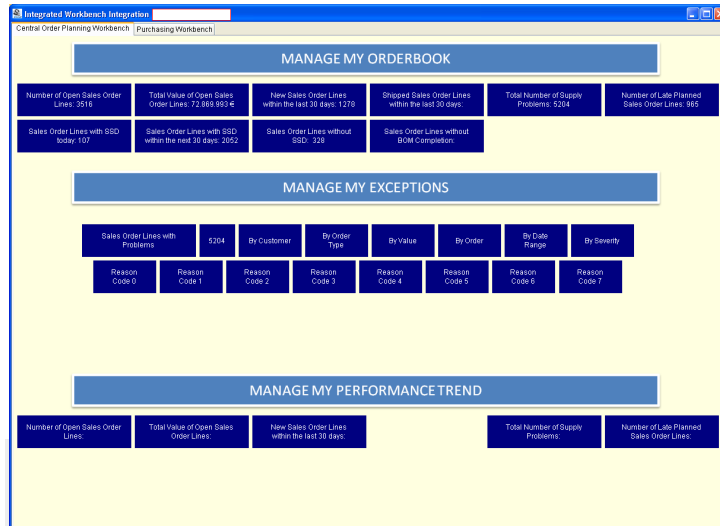


Purchasing Workbench

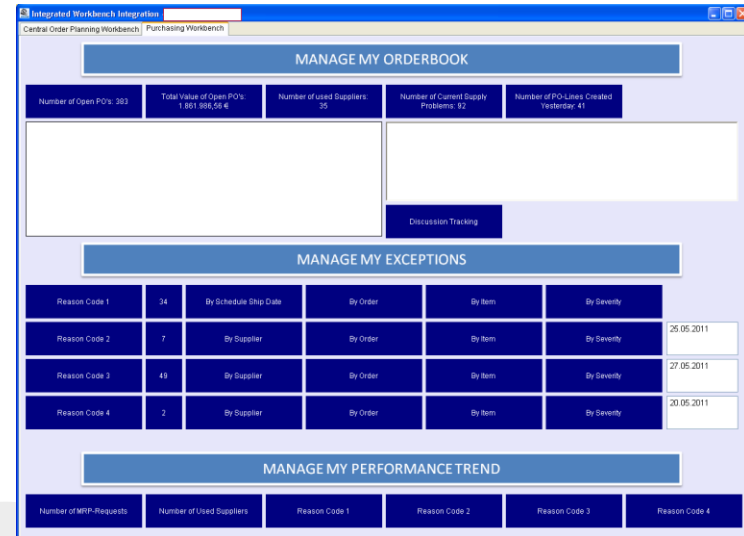

Kernfunktionen

- Behandlung der Ausnahme transparent für den Kundenauftrag
- Die Knöpfe zeigen die Zahlen an, die sich hinter Ihnen verbergen
- Kennzahlen auf individueller Ebene
- < Sekunde, um die Informationen abzufragen

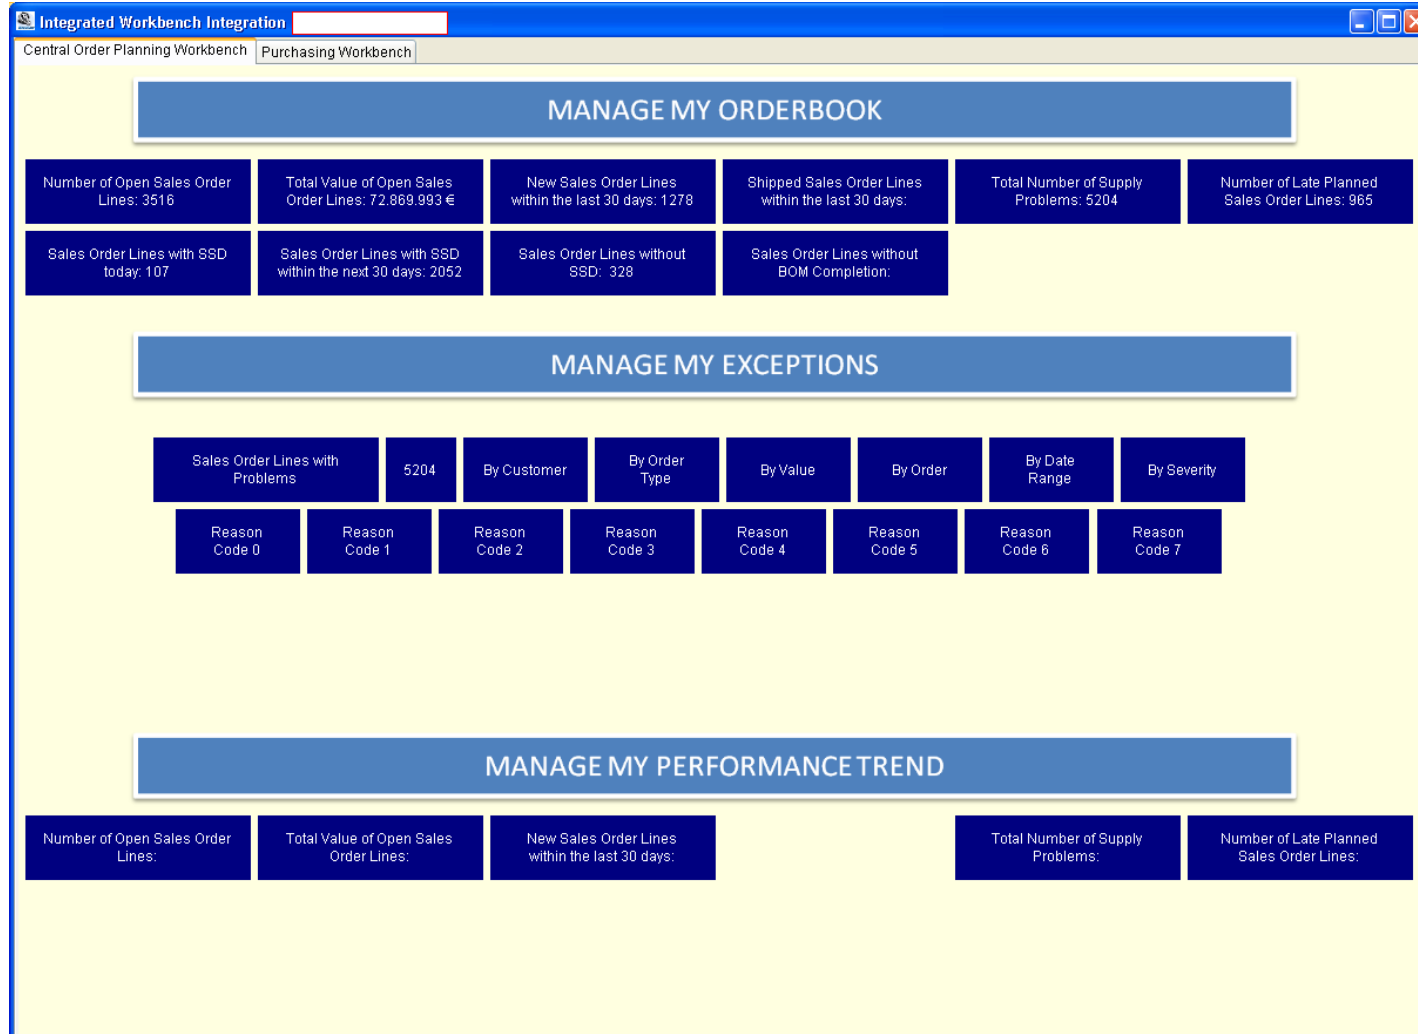

Aufträge

Ausnahmen


Verlauf



Sales Order Lines Derzeit offene Kundenaufträge.	Supply Problems Gesamtzahl von Planausnahmen.	Lines without SSD Anzahl von Kundenordern ohne Liefertermin.
Total Value Gesamtpreis der offenen Kundenaufträge.	Late Planned Sales Orders Anzahl der Kundenaufträge, die von Problemen betroffen sind.	
New sales order lines Neu eingegebene Aufträge.	SSD today Anzahl der heutigen Lieferungen.	



MANAGE MY EXCEPTIONS



Lines with problems

Nur ansehen der Aufträge, die ein Problem haben.

By Order Type

Ansehen entsprechend der Order Types.

By Severity

Ansehen der Aufträge mit dem höchsten Wert und den meisten Problemen.

Number 5204

Anzahl der derzeitigen Probleme.

By Value

Ansehen der Aufträge mit dem höchsten Wert.

By Customer


Ansehen der Kunden, die die meisten Probleme haben.

By Order

Einen gesamten Kundenauftrag lösen.



MANAGE MY EXCEPTIONS



Reason Code 0

Die technische Definition sollte vollständig sein.

Reason Code 3

Das versprochene Lieferdatum ist zu spät.

Reason Code 6

Beginn des Fertigungsjobs liegt in der Vergangenheit.

Reason Code 1

Im Einkauf sollte der Kaufauftrag platziert sein.

Reason Code 4

Das versprochene Lieferdatum liegt in der Vergangenheit.

Reason Code 7

Das Fertigstellungsdatum des Fertigungsauftrages liegt in der Vergangenheit.

Reason Code 2

Einkauf sollte eine Lieferantenbestätigung einholen.

Reason Code 5

Der Fertigungsauftrag muss erstellt werden.



MANAGE MY PERFORMANCE TREND






Number of Open Sales Order Lines:

Total Value of Open Sales Order Lines:

New Sales Order Lines within the last 30 days:

Total Number of Supply Problems:

Number of Late Planned Sales Order Lines:

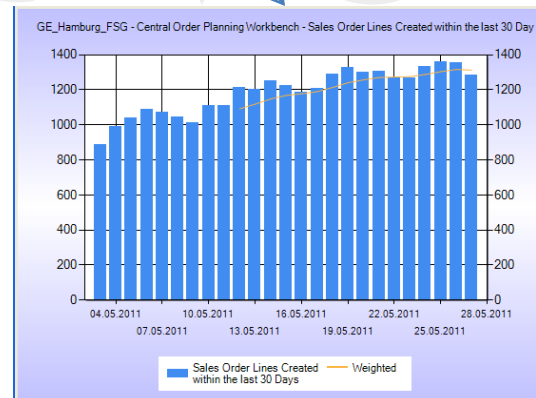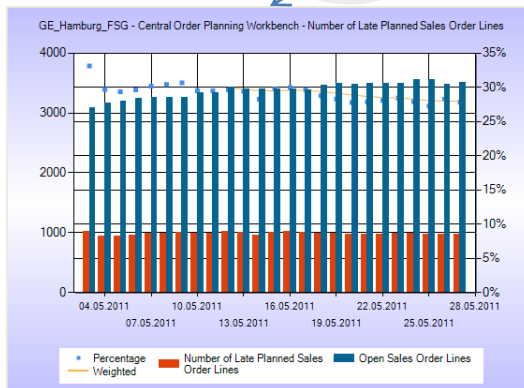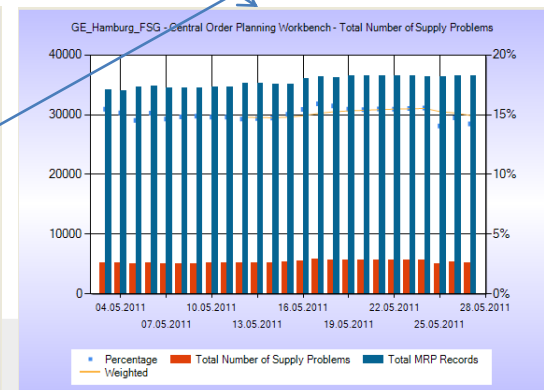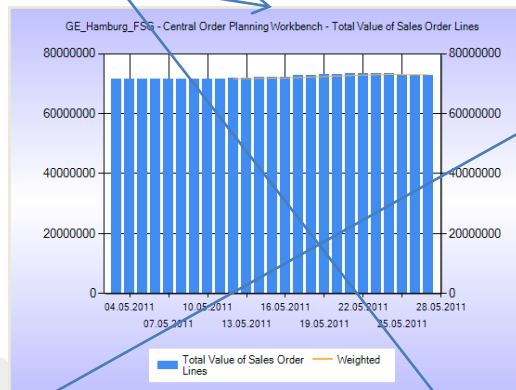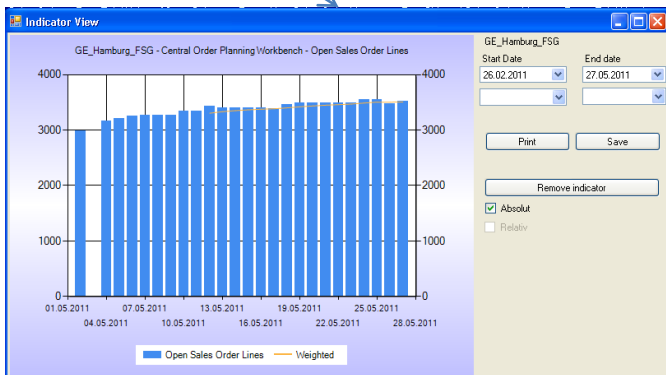



MANAGE MY ORDERBOOK

Number of Open PO's: 383

Total Value of Open PO's:
1.861.986,56 €

Number of used Suppliers:
35

Number of Current Supply
Problems: 92

Number of PO-Lines Created
Yesterday: 41

Discussion Tracking

Number of open PO's

Anzahl der offenen Zeilen auf
Einkaufsaufträgen.

Total Value

The value der offenen
Einkaufsaufträge.

Number of suppliers

Anzahl der derzeit verwendeten
Lieferanten.

Current Supply Problems

Wie viele Versorgungsprobleme
man gerade hat.

PO Lines created yesterday

Anzahl der gestern erstellten
Einkaufsaufträge.



MANAGE MY EXCEPTIONS

Reason Code 1	34	By Schedule Ship Date	By Order	By Item	By Severity	
Reason Code 2	7	By Supplier	By Order	By Item	By Severity	25.05.2011
Reason Code 3	49	By Supplier	By Order	By Item	By Severity	27.05.2011
Reason Code 4	2	By Supplier	By Order	By Item	By Severity	20.05.2011

Reason Code 1

Anzahl der Einkaufsaufträge, die in der Vergangenheit platziert werden müssen.

Reason Code 2

Anzahl ohne Lieferbestätigung.

Reason Code 3

Anzahl mit zu spätem Lieferdatum.

Reason Code 4

Lieferdatum in der Vergangenheit.

By Schedule Ship Date

Nach Lieferdatum des Kundenauftrages.

By Order

Nach Kundenauftrag sortiert.

By Item

Nach Artikel sortiert.

By Severity

Nach Schwere des Vorfalls.

